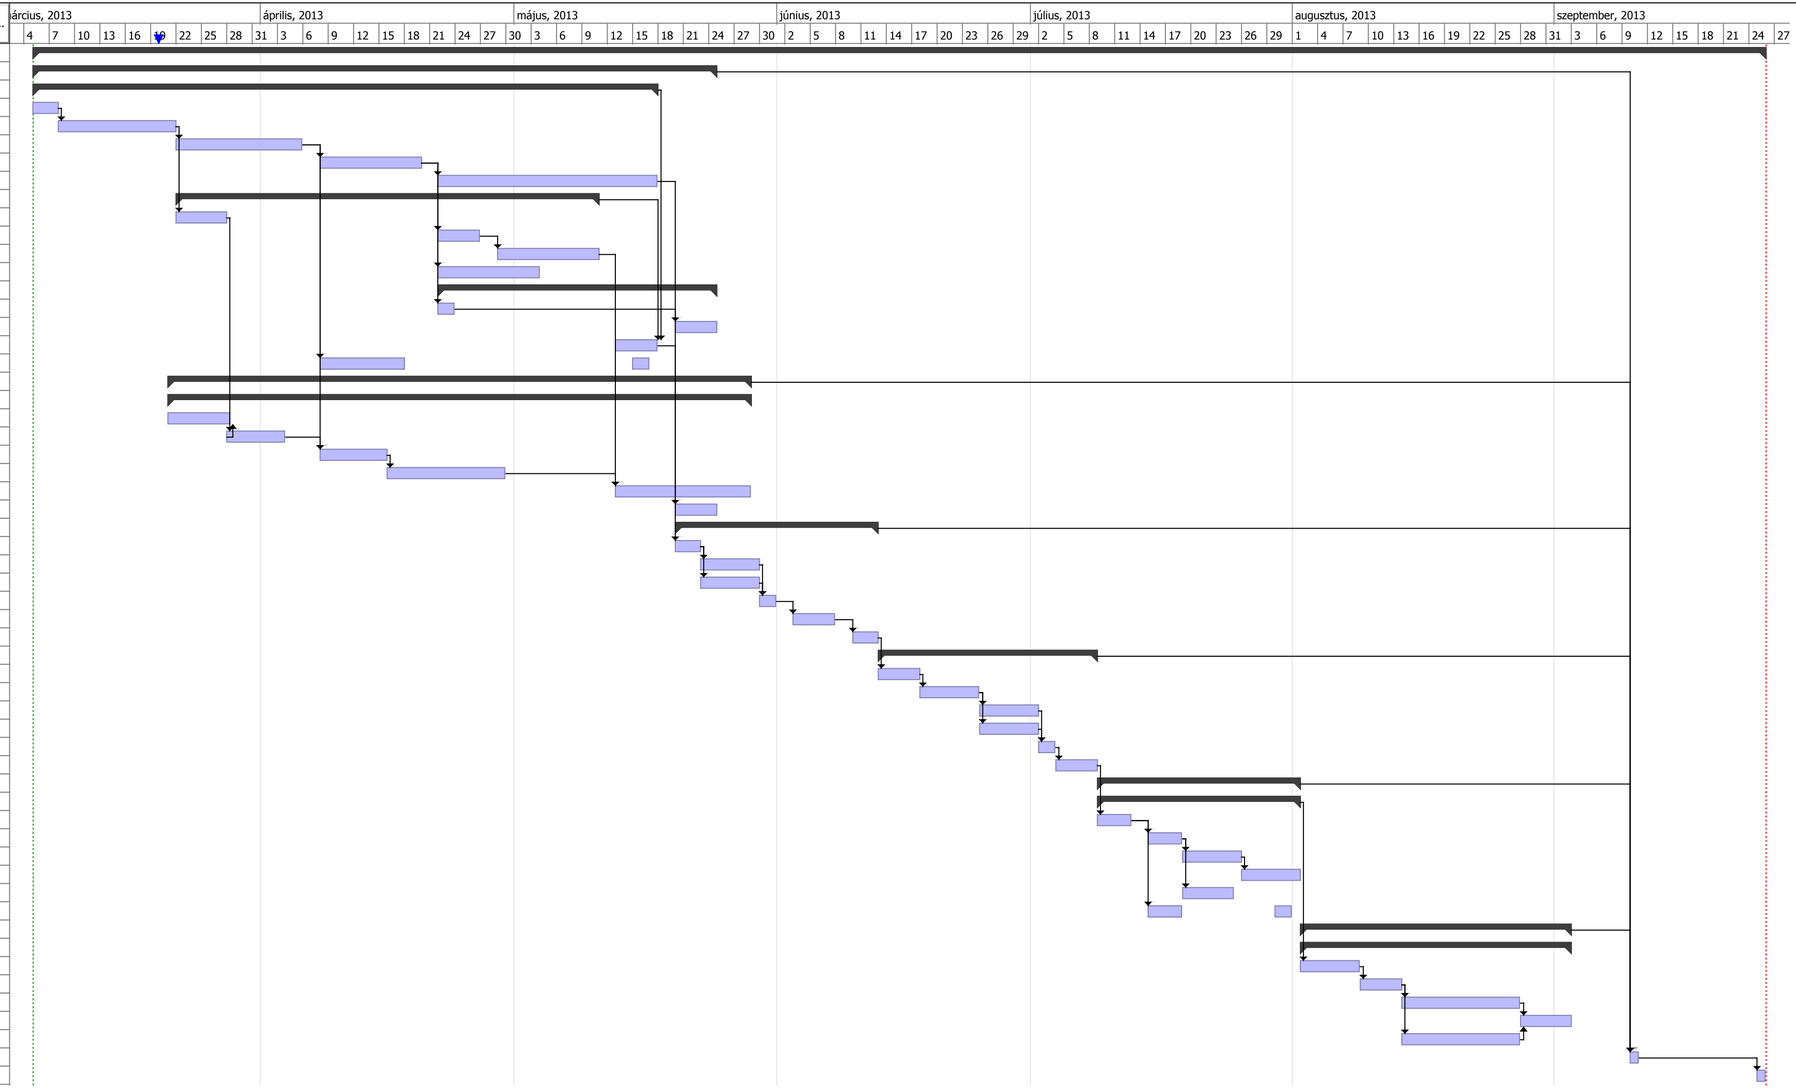	In...	Ta...	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource N...
1			**Rétság Városközpont...**	**147d**	**2013.03.05. 8:00**	**2013.09.25. 17:00**		
2			**buszforduló építése**	**59d**	**2013.03.05. 8:00**	**2013.05.24. 17:00**		
3			**útépítés**	**54d**	**2013.03.05. 8:00**	**2013.05.17. 17:00**		
4			bontási munka	3d	2013.03.05. 8:00	2013.03.07. 17:00		
5			földmunka	10d	2013.03.08. 8:00	2013.03.21. 17:00	4	
6			csapadékcsa...	11d	2013.03.22. 8:00	2013.04.05. 17:00	5	
7			alépítményi ...	10d	2013.04.08. 8:00	2013.04.19. 17:00	6	
8			felépítményi ...	20d	2013.04.22. 8:00	2013.05.17. 17:00	7	
9			**lépcső építése...**	**36d**	**2013.03.22. 8:00**	**2013.05.10. 17:00**		
10			földmunka	4d	2013.03.22. 8:00	2013.03.27. 17:00	5	
11			alépítményi ...	5d	2013.04.22. 8:00	2013.04.26. 17:00	7	
12			felépítményi ...	10d	2013.04.29. 8:00	2013.05.10. 17:00	11	
13			zajvédőfal építése	10d	2013.04.22. 8:00	2013.05.03. 17:00	7	
14			**gyalogos híd é...**	**25d**	**2013.04.22. 8:00**	**2013.05.24. 17:00**		
15			hídfők beton...	2d	2013.04.22. 8:00	2013.04.23. 17:00	7	
16			hídszerkezet ...	5d	2013.05.20. 8:00	2013.05.24. 17:00	15FS+18d	
17			kertészeti munkák	5d	2013.05.13. 8:00	2013.05.17. 17:00	3FF,9FF	
18			elektromos munk...	10d	2013.04.08. 8:00	2013.05.16. 17:00	6	
19			**Piac tér építése**	**49d**	**2013.03.21. 8:00**	**2013.05.28. 17:00**		
20			**útépítés**	**49d**	**2013.03.21. 8:00**	**2013.05.28. 17:00**		
21			bontási munka	5d	2013.03.21. 8:00	2013.03.28. 8:00	22SF	
22			földmunka	5d	2013.03.28. 8:00	2013.04.03. 17:00	10	
23			csapadékcsa...	6d	2013.04.08. 8:00	2013.04.15. 17:00	22,6	
24			alépítményi ...	10d	2013.04.16. 8:00	2013.04.29. 17:00	23	
25			felépítményi ...	12d	2013.05.13. 8:00	2013.05.28. 17:00	24,12	
26			kertészeti munkák	5d	2013.05.20. 8:00	2013.05.24. 17:00	17	
27			**Kossuth út építése**	**18d**	**2013.05.20. 8:00**	**2013.06.12. 17:00**		
28			bontási munkák	3d	2013.05.20. 8:00	2013.05.22. 17:00	8	
29			vízelvezető folyók..	5d	2013.05.23. 8:00	2013.05.29. 17:00	28	
30			közműszerelvény...	5d	2013.05.23. 8:00	2013.05.29. 17:00	28	
31			aszfaltozás	2d	2013.05.30. 8:00	2013.05.31. 17:00	29,30	
32			járdaépítés	5d	2013.06.03. 8:00	2013.06.07. 17:00	31	
33			kertészeti munkák	3d	2013.06.10. 8:00	2013.06.12. 17:00	32	
34			**Zrínyi út építése**	**18d**	**2013.06.13. 8:00**	**2013.07.08. 17:00**		
35			bontási munkák	3d	2013.06.13. 8:00	2013.06.17. 17:00	33	
36			útszélesítés	5d	2013.06.18. 8:00	2013.06.24. 17:00	35	
37			vízelvezető folyók..	5d	2013.06.25. 8:00	2013.07.01. 17:00	36	
38			közműszerelvény...	5d	2013.06.25. 8:00	2013.07.01. 17:00	36	
39			aszfaltozás	2d	2013.07.02. 8:00	2013.07.03. 17:00	37,38	
40			kertészeti munkák	3d	2013.07.04. 8:00	2013.07.08. 17:00	39	
41			**Iskola parképítés**	**18d**	**2013.07.09. 8:00**	**2013.08.01. 17:00**		
42			**kertészeti mu...**	**18d**	**2013.07.09. 8:00**	**2013.08.01. 17:00**		
43			irtás, fakivágás	4d	2013.07.09. 8:00	2013.07.12. 17:00	40	
44			tereprendezés	4d	2013.07.15. 8:00	2013.07.18. 17:00	43	
45			meglévő bet...	5d	2013.07.19. 8:00	2013.07.25. 17:00	44	
46			füvesítés, nö...	5d	2013.07.26. 8:00	2013.08.01. 17:00	45	
47			játszótéri ját...	4d	2013.07.19. 8:00	2013.07.24. 17:00	44	
48			elektromos munk...	6d	2013.07.15. 8:00	2013.07.31. 17:00	43	
49			**Művelődési ház el...**	**22d**	**2013.08.02. 8:00**	**2013.09.02. 17:00**		
50			**kertészeti mu...**	**22d**	**2013.08.02. 8:00**	**2013.09.02. 17:00**		
51			irtás, fakivágás	5d	2013.08.02. 8:00	2013.08.08. 17:00	42	
52			tereprendezés	3d	2013.08.09. 8:00	2013.08.13. 17:00	51	
53			meglévő bet...	10d	2013.08.14. 8:00	2013.08.27. 17:00	52	
54			füvesítés, nö...	4d	2013.08.28. 8:00	2013.09.02. 17:00	53,55	
55			szobor áthely..	10d	2013.08.14. 8:00	2013.08.27. 17:00	52	
56			a munka készrejelent...	1d	2013.09.10. 8:00	2013.09.10. 17:00	49FS+5d,41...	
57			műszaki átadás	1d	2013.09.25. 8:00	2013.09.25. 17:00	56FS+10d
